



# 107年度第1季公共建設 推動辦理情形

行政院公共工程委員會

107年5月24日


# 工程會列管範圍

- 工程會列管包含「五千萬元以上公共建設計畫」(分為水資源、電力能源、五加二產業、一般公共建設等類別)、「公共建設類前瞻基礎建設計畫」兩大類。
- 107年度列管281項計畫，截至3月底，進度符合182項、進度落後99項，列管預算4,328.68億元。

項次	類別	重大政策	項數	進度符合(項)	進度落後(項)	金額(億元)
一	五千萬元以上公共建設計畫	水資源	18	14	4	439.58
		電力能源	21	15	6	623.58
		五加二產業	4	3	1	32.32
		一般計畫	169	95	74	2,359.44
一一	公共建設類前瞻計畫(第一期)		69	55	14	873.76
	合計		281	182	99	4,328.68

# 五千萬元以上公共建設計畫預算執行情形

- 五千萬元以上公共建設計畫部分，計有212項計畫，截至3月底，進度符合127項、進度落後85項，可支用預算3,454.92億元，已執行646.69億元，年分配預算執行率118.09%，年可支用預算達成率18.72%。

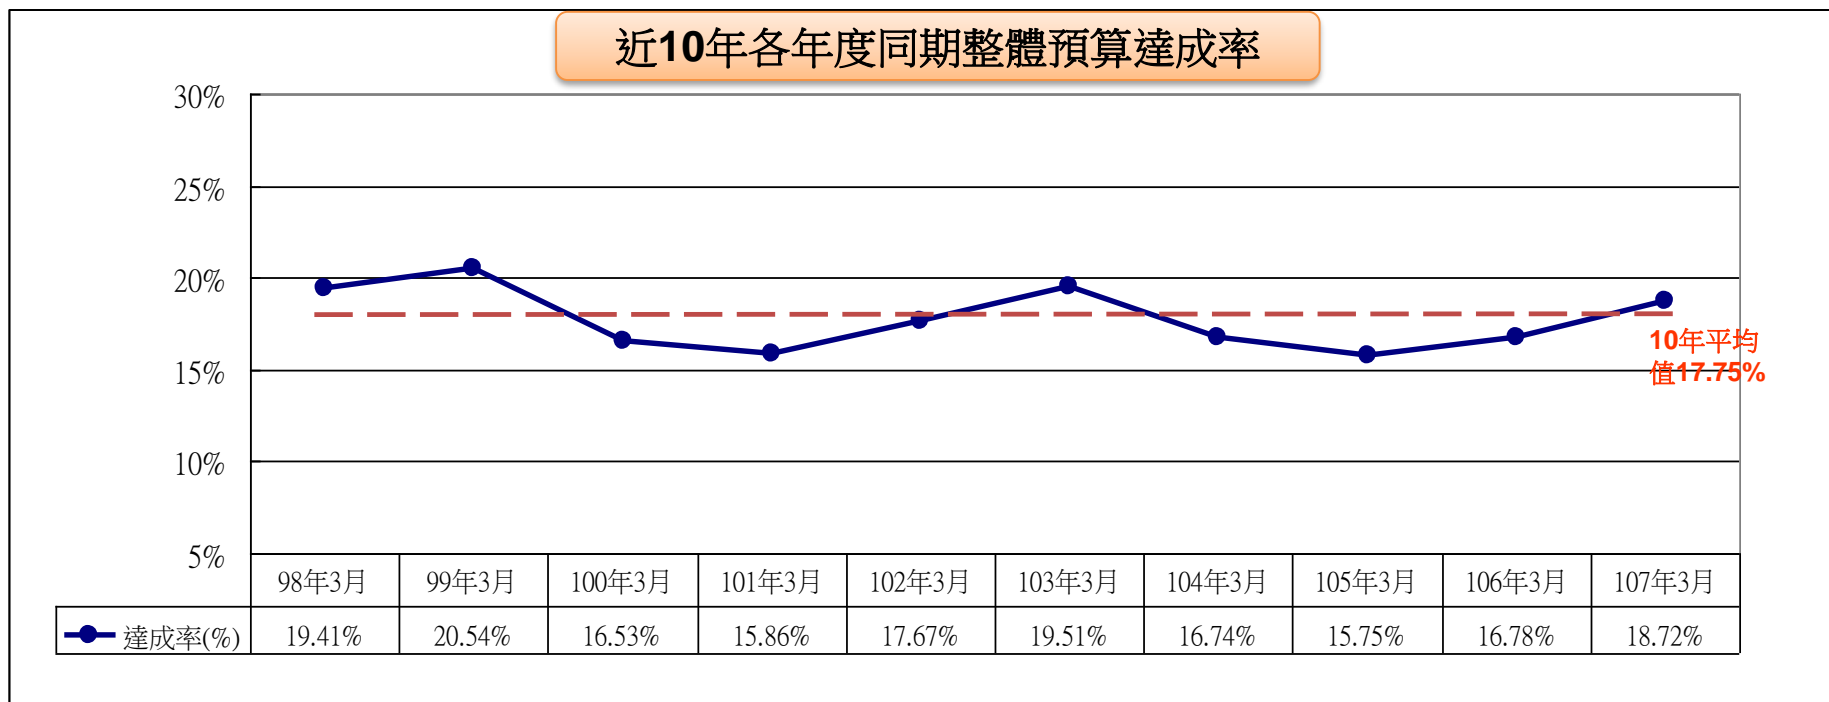

# 重大政策類別計畫執行情形

- 工程會針對重大政策目標進一步分類列管，如水資源、電力能源、五加二產業涉及公共建設計畫、一般公共建設計畫等，協助提供產業營運所需之資源。

項次	類別	計畫項數	預算數(億元)	年分配預算執行率(%)
1	水資源	18	439.58	97.90
2	電力能源	21	623.58	116.34
3	五加二產業	4	32.32	155.03
4	一般計畫	169	2,359.44	124.73
	合計	212	3,454.92	18.72

# 前瞻計畫預算執行情形

- 公共建設類前瞻基礎建設計畫共計69項計畫，截至3月底，進度符合55項、進度落後14項，第一期(106-107年)預算873.76億元，執行139.97億元，總分配預算執行率81.97%，總計畫經費達成率16.02%。

項次	計畫類別	整合機關	計畫項數	預算(億元)	達成率(%)
1	軌道建設	交通部	36	165.67	7.9
2	水環境建設	經濟部	12	251.17	36.65
3	綠能建設	經濟部	5	60.54	31.45
4	城鄉建設	內政部	12	350.35	4.16
5	因應少子化友善育兒空間建設	衛福部	2	19.61	5.1
6	食品安全建設	衛福部	1	3.08	5.53
7	人才培育促進就業建設	教育部	1	23.34	0.19
	合計		69	873.76	16.02

# 協處案例



淡江大橋，第3標主橋段七次招標均流標。多次協助開會研商、檢討招標文件，第3標主橋段工程第八次招標於4月17日評選出最有利標廠商，修正計畫交通部已於5月1日報行政院。



桃園機場第三航廈，主體航廈工程招標工作落後。於107年4月25日訪查，討論招標進度與困難問題，目前該案已於5月8日上網招標。



烏溪烏嘴潭人工湖計畫，遭遇用地取得問題。於107年1月16日現勘，徵收計畫書於4月25日審議通過，預計107年6月底前完成用地取得事宜。



林口電廠，遭遇人力短缺、煤倉橫梁開裂、浚挖填土去化等問題。於106年11-12月視察、訪查，107年1月15日協調解決相關問題。



南港生技園區，統包商整合能力不佳、現場人力不足。每週至中研院參加會議，多次至現場督導、勘查。目前已全區取得使照並提報竣工，人員陸續進駐使用。
