


杜蘇芮與卡努颱風災後道路復原情形



- 台14線、台14甲線沿線災損說明：14處嚴重坍方及5處大規模路基缺口，已於8月6日單線搶通。
- 目前台14線75.9k及76.2k2處交通管制，預計8月18日前完成短期保護。

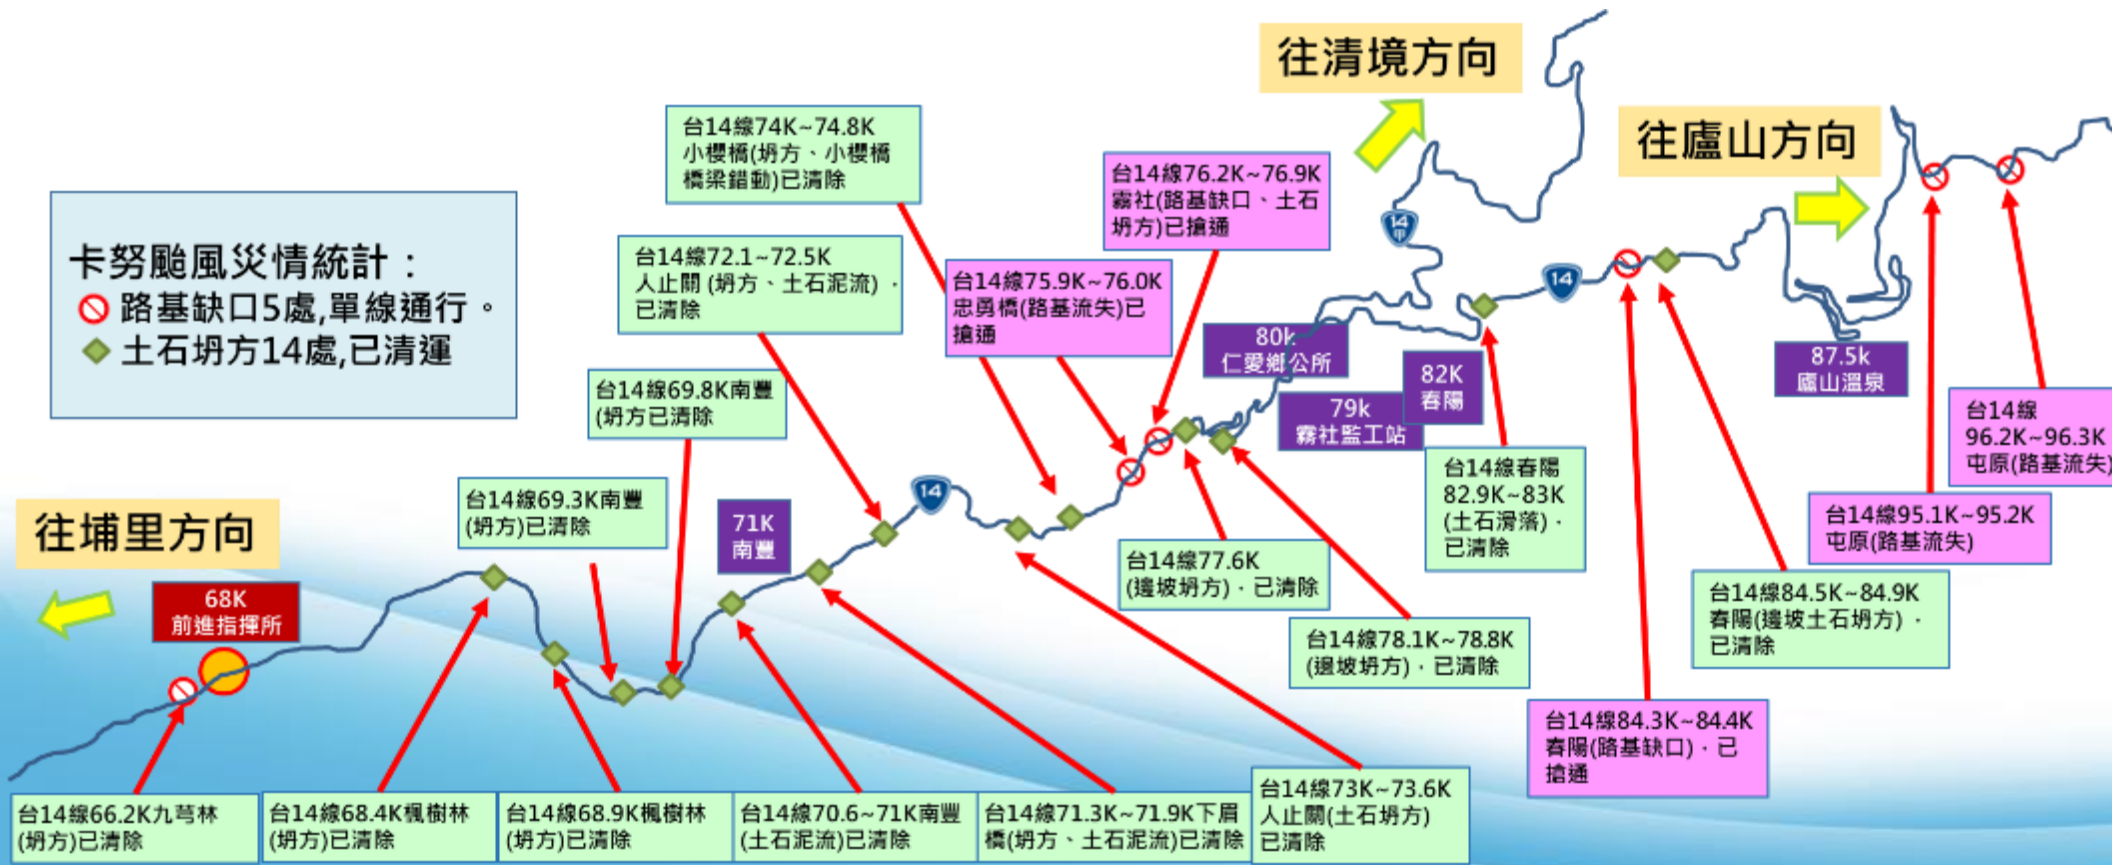

台14線71K 土石流災情

杜蘇芮與卡努颱風災後道路復原情形

- 行政院鄭副院長及部長於8月6日赴災區視察，公路總局已依112年8月7日蔡總統視察指示，完成台14線沿線6萬方坍方土方清除，後續將持續辦理台14線5處路基缺口復建，概估總復建經費約1.78億元，預計113年6月底全部完成。

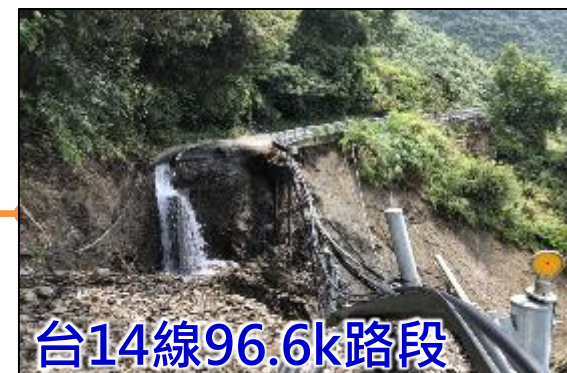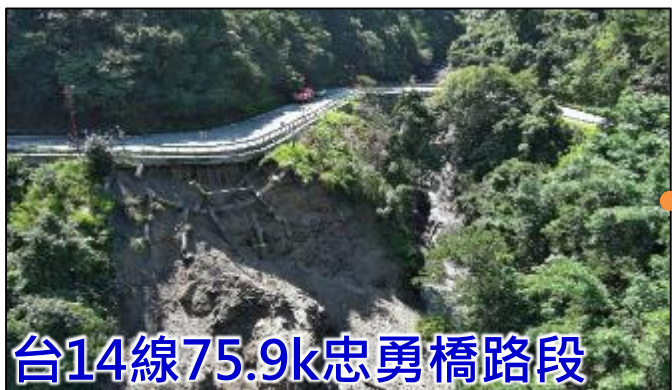

杜蘇芮與卡努颱風災後道路復原情形

□ 台20線南橫公路「明霸克露橋鋼便橋」搶修復原，依8月7日行政院陳院長視察指示，原則分4階段進行搶修復原：

- 1.第1階段：8月8日完成人行便道供居民戒護步行通過，並由公路總局協助接駁至桃源區公所及市區(已完成)。
- 2.第2階段：打設河床涵管便道，以8月12日完成為目標(須視天候及河床施工安全狀況許可下)。
- 3.第3階段：鋼便橋修復以9月30日搶修完成為目標。
- 4.第4階段：辦理「明霸克露橋中期修復工程」，以懸臂橋梁工法施作(已發包)，預計114年8月完工。



杜蘇芮與卡努颱風災後道路復原情形

台20線向陽路段災損說明：路基流失淘空約300公尺，道路沉陷變形100公尺。

第1階段：預計112年8月21日完成緊急通行便道，提供緊急及施工人員通行使用。

第2階段：預計112年10月30日搶通便道恢復民眾通行。

第3階段：已施工中，預計於114年8月完成雪峰橋復建工程。

