

行政院第3806次會議




公共建設流標情形分析 及機關應有作為

行政院公共工程委員會
1 1 1 年 6 月 9 日


公共建設推動情形

106年起經費及執行率逐年增加

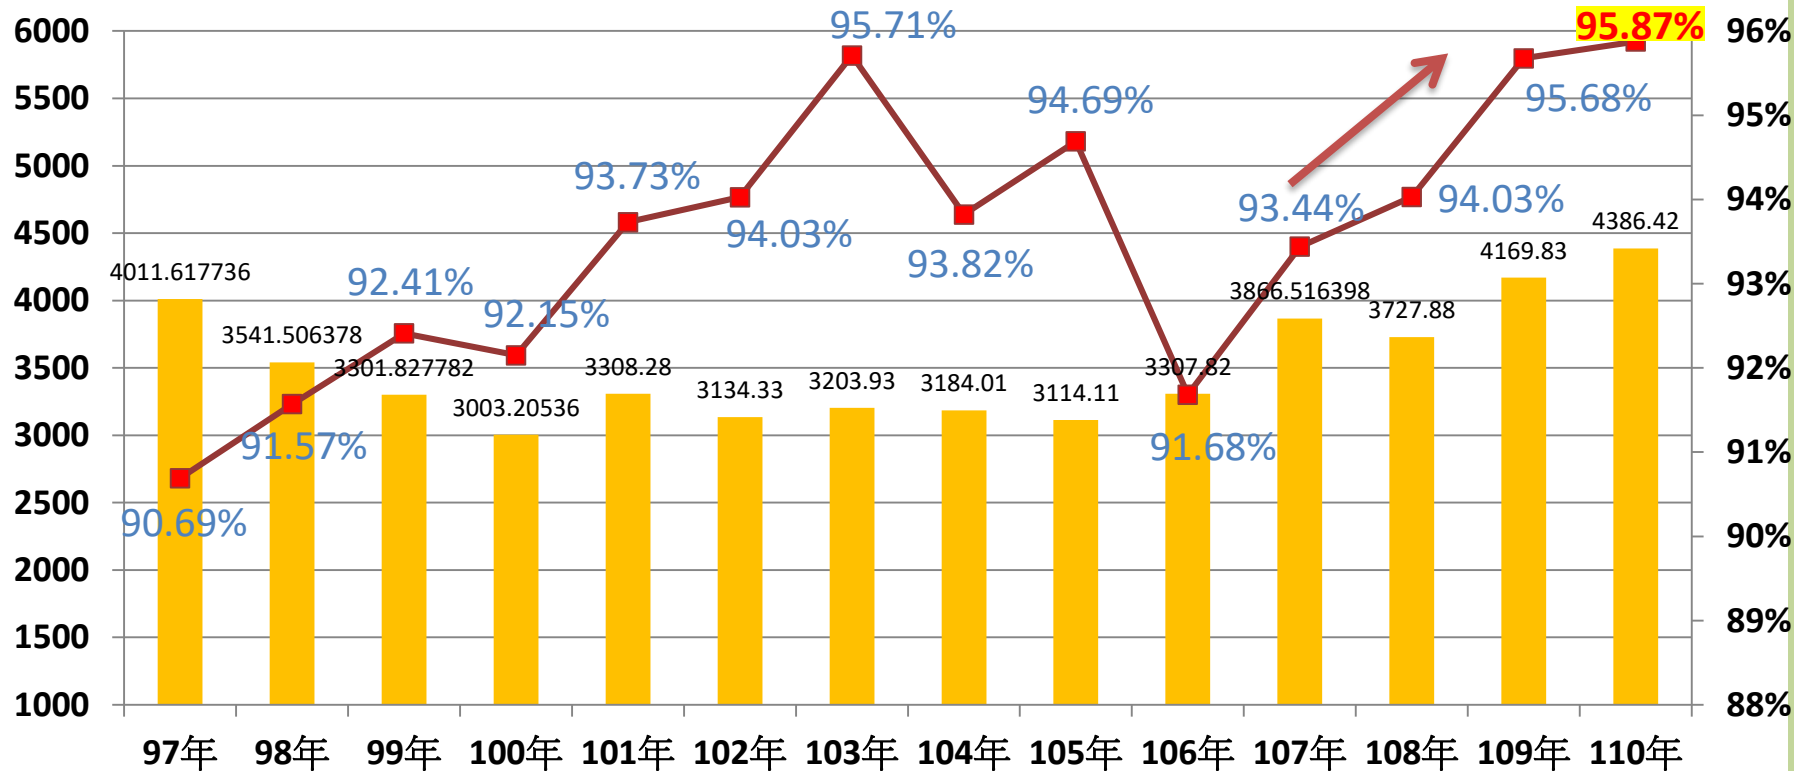

工程流標情形分析

九成案件順利決標

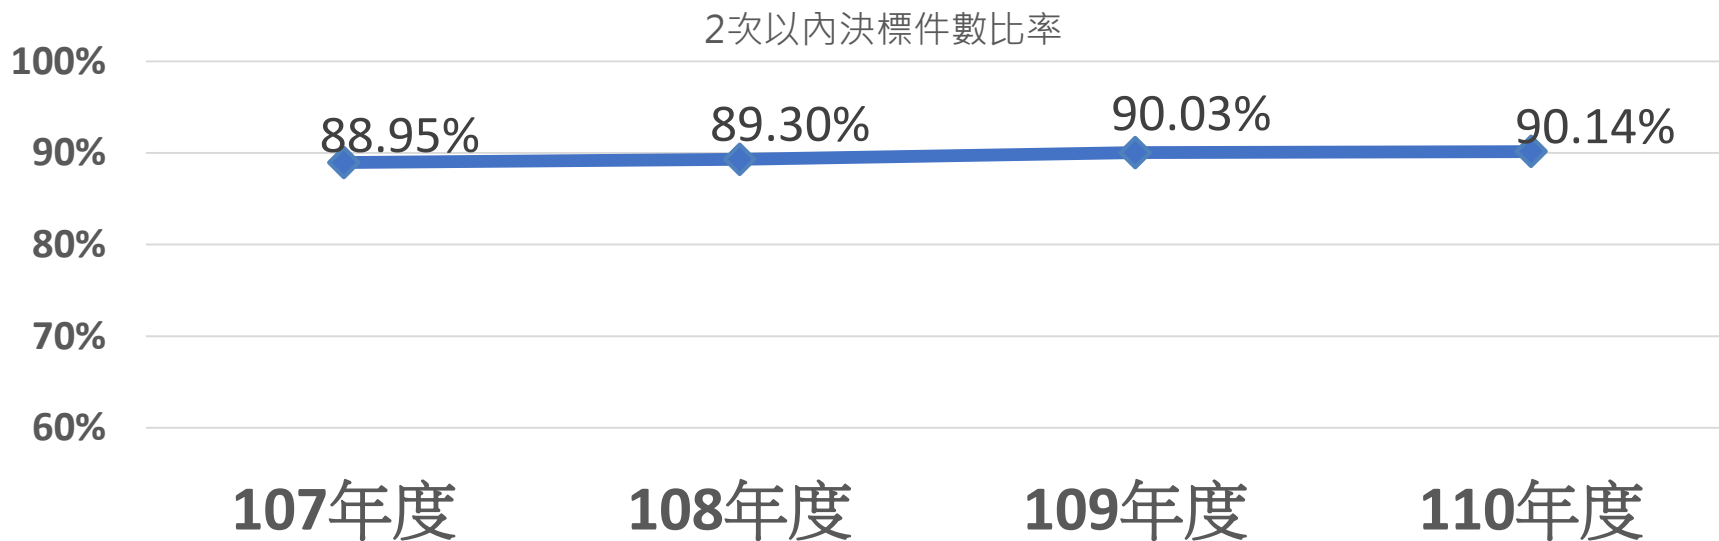

- 近年順利決標比率平穩

工程流標情形分析

部分案件流標主因

一、未按實際價格編列預算。

二、未按實際需要訂定工期。

三、契約書圖規定不合理。

因應作法

缺工
缺料
物價上漲

每月檢視供需平衡

河川疏浚充分供應砂石

砂石、飛灰固定價格讓售

水泥貨物稅減半

契約約定三層級物調


以外籍移工補充

經濟部、財政部協助

勞動部協助

因應作法-預拌混凝土價格穩定

重要項目個別指數

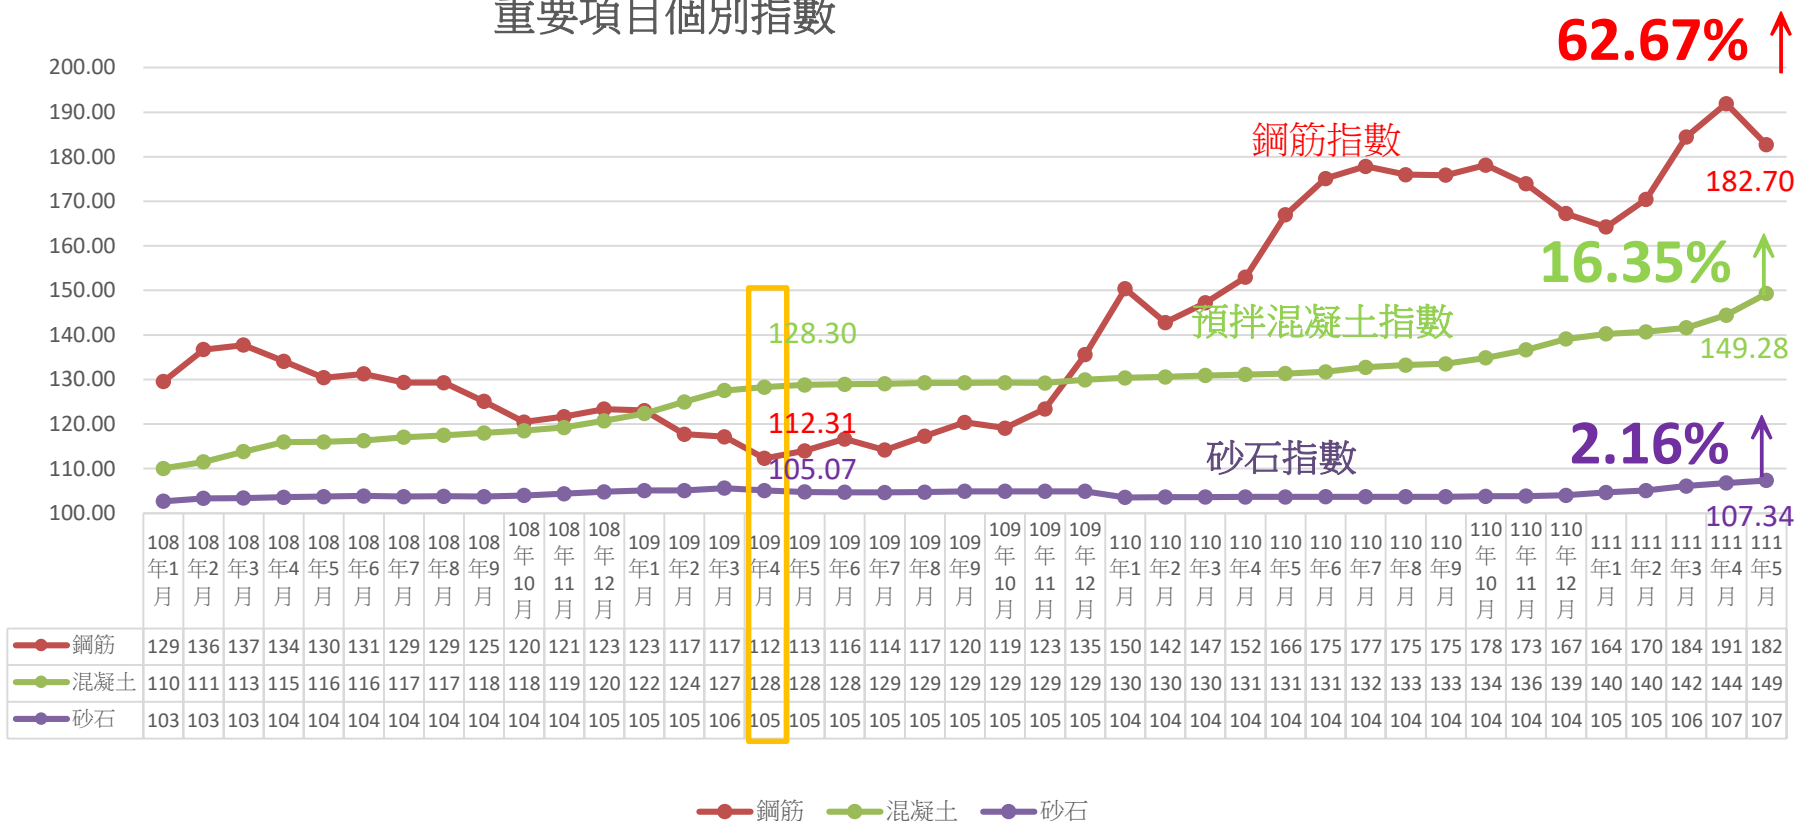

因應作法-外籍移工補充人力

本國營造工32萬人
(公共工程11.2萬人)

外籍移工補充人力
8,604人

勞
動
部
協
助

機關應有作為

缺工
缺料
物價上漲

每月檢視供需平衡

河川疏浚充分供應砂石

砂石、飛灰固定價格讓售

水泥貨物稅減半

契約約定三層級物調

以外籍移工補充

+

機關應辦

預算應符合實際

工期應符合實際

契約書圖應合理

機關應有作為

(一)依物價合理編列預算

(二)依工地特性訂定工期

(三)審查契約規定合理性
